


T.P 2 Practicas

Profesionalizantes I

Gestión de Proyectos

1-

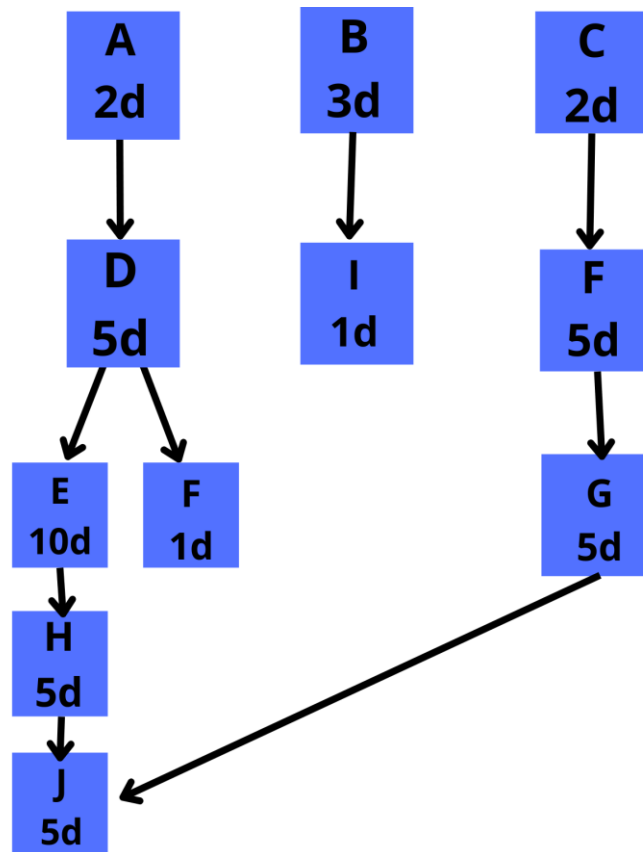

2- Caminos Posibles y duraciones

1) Camino 1: A→D→E→H→J

Duración: $2 + 5 + 10 + 5 + 5 = 27$ Días

2) Camino 2: C→D→E→H→J

Duración: $2 + 5 + 10 + 5 + 5 = 27$ Días

3) Camino 3: C→F→G→J

Duración: $2 + 1 + 5 + 5 = 13$ Días

4) Camino 4: B→I


Duración: $3 + 1 = 4$ Días

Camino crítico: Camino 1 o Camino 2 tienen duración 27 días

2-

Letra	Dependencia	Duración días
A	-	5
B	A	2
C	B	2
D	A	1
E	D	1
F	C, E	1
G	E	10
H	G, F	1
I	H	0,5
J	I	0,5
K	D	1
L	J, K	1,5

Grafico de Proceso:

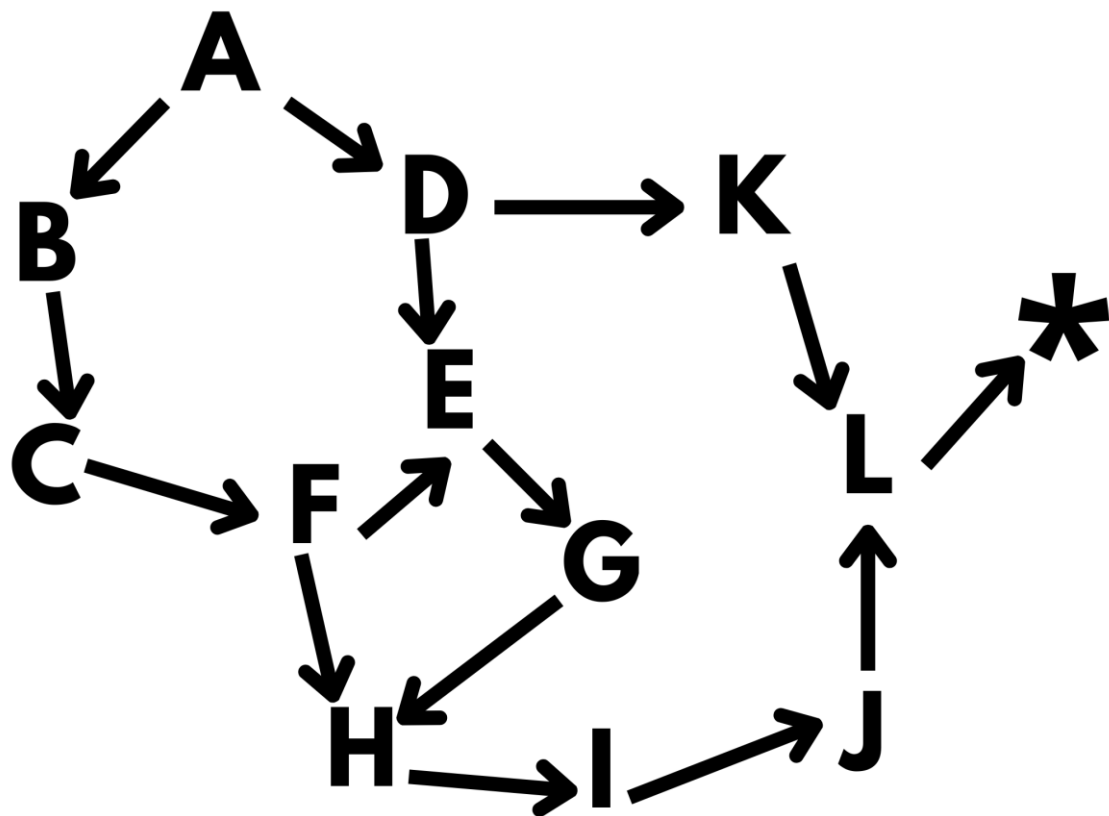

Camino y sus posibles duraciones:

Camino A: A→D→E→G→H→I→J→L

Duración: $5 + 1 + 1 + 10 + 1 + 0.5 + 0.5 + 1.5 = 20.5$ días

Camino B: A→B→C→F→H→I→J→L


Duración : $5 + 2 + 2 + 1 + 1 + 0.5 + 0.5 + 0.5 + 1.5 = 14.5$ días

Camino C: D→K→L

Duración : $1 + 1 + 1.5 = 3.5$ días

Camino Crítico: Camino A tiene duración de 20.5 días por lo tanto es el camino critico.

Diagrama de Procesos:

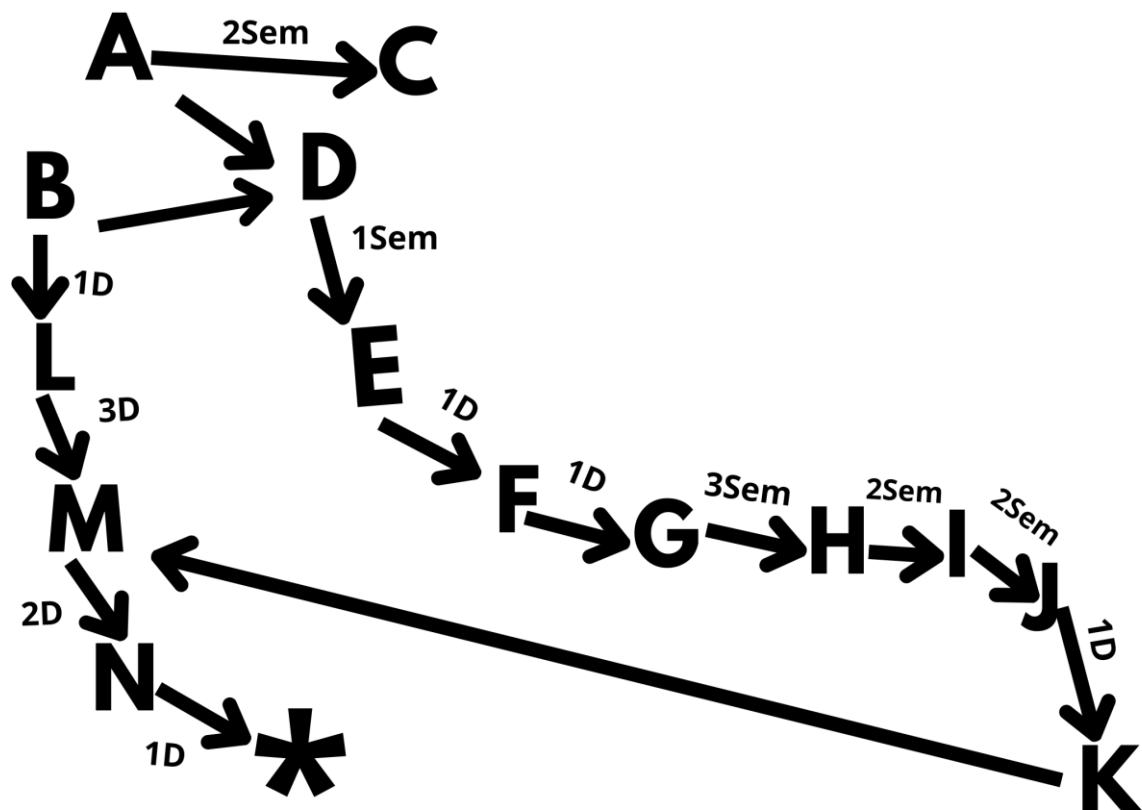

Camino Posibles y duraciones

Camino 1: A→C→D→E→F→G→H→I→J→K→N

Duración: 10 + 5 + 1 + 15 + 10 + 10 + 1 + 1 + 1 = 54 días

Camino 2: A→C→D→E→F→G→H→I→K

Duración: 10 + 5 + 1 + 15 + 10 + 10 + 1 + 1 = 53 días


Camino 3: B→L→M→N

Duración: 1 + 3 + 2 + 1 = 7 días

Camino critico: es el camino 1 con 54 días.

Letra	Actividad	Duración días	Dependencia
A	Limpieza del terreno	2	-
B	Excavación de cimientos	3	A
C	Fundaciones (Homigón)	5	B
D	Levantar estructura de paredes	7	C
E	Colocar Techo	4	D
F	Instalación eléctrica inicial	4	D
G	instalación de Plomería	4	D
H	Revoques internos	5	E, F, G
I	Colocación de pisos	3	H
J	Instalación de aberturas	2	H
K	Pintura	4	I, J
L	Instalación eléctrica final	2	K
M	Instalación sanitaria final	2	K
N	Limpieza Final	1	L,M
O	Entrega de obra	1	N

Diagrama de Procesos

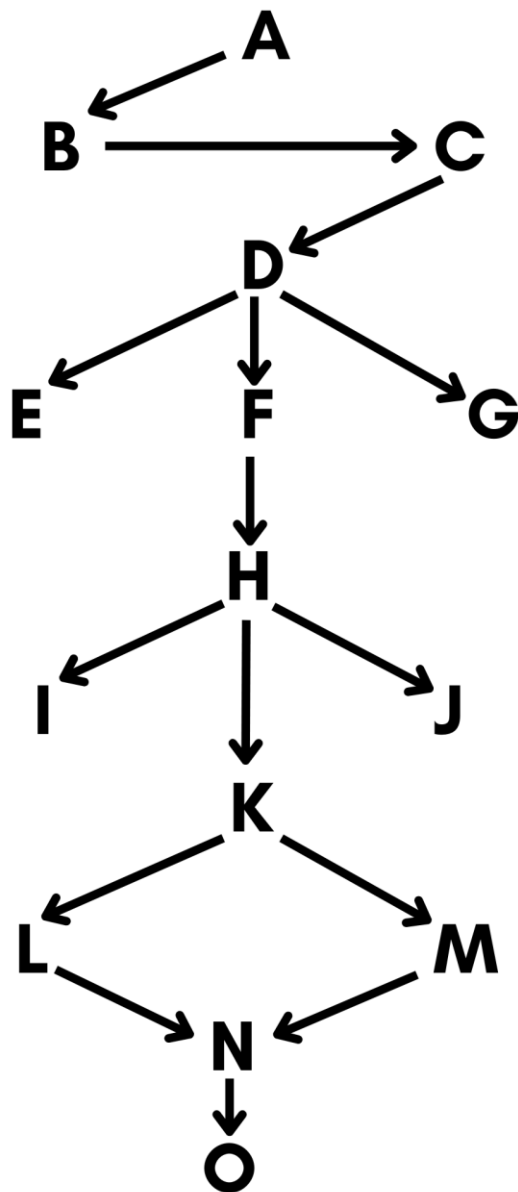

Camino Posibles y sus duraciones:

Camino 1: A→B→C→D→E→F→G→H→I→J→K→L→M→N→O

Duración: $2+3+5+7+4+4+3+5+3+2+4+3+2+1+1= 55$ días

Camino 2: A→B→C→D→G→H→I→J→K→L→M→N→O

Duración: $2+3+5+7+3+5+3+2+4+3+2+1+1= 41$ días

Camino 3: A→B→C→E→F→H→I→J→K→L→M→N→O

Duración: $2+3+5+7+4+4+5+3+2+4+3+2+1+1= 51$ días

Camino Critico = Camino A tiene duración de 55 días

